

 		Relatório nº	40
		Data do relatório	10/07/2022
		Dia da semana	Domingo
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	00034
Obra	Escola estadual	Prazo contratual	214 dias
Local	Centro Santa Luzia	Prazo decorrido	40 dias
Contratante	Prefeitura	Responsável	José Silva Siqueira
		Prazo a vencer	174 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00	Manhã	☀ Claro	Praticável	2 mm
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável	

Mão de obra (8) / Falta (1)						
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas		
Alexander William	Engineer	09:00 - 16:00	01:00	06:00	Empresa Z	
André Fabio	Servente	07:00 - 17:00	01:00	09:00	Mão de Obra Direta	
Aparecido Silva	Pedreiro	08:00 - 17:00	01:00	08:00		
Evandro Lima	Servente	08:00 - 17:00	01:00	08:00		
Izael Oliveira	Servente	08:00 - 17:00	01:00	08:00		
Luis Miguel	Ingeniero	09:00 - 16:00	01:00	06:00	Subcontratado	
Miranda Souza	Engenheiro Civil	10:00 - 17:00	02:00	05:00	Terceiros	
Jucelino Faria	Pedreiro	-		Falta		

Equipamentos (28)					
Alicates 1	Andaimes 4	Arcos de serra 1	Betoneira 3	Bomba d'agua 2	Caminhão basculante 3
Carrinho de mão 3	Compactador de solo 2	Escavadeira 2	Furadeira 2	Gerador de energia 1	Guindaste 1 10:00 - 15:30 (5h e 30min)
Picareta 2	Pá carregadeira 1				

Atividades (5)		
1.8 - Retirada e reinstalação de tubos de ferro fundido com junta elástica		13:00 até 14:30 (1h e 30min) 50% - Em Andamento
3.1 - Fornecimento e instalação de pastilha cerâmica medindo 5cm x 5cm, cor super branco, marca de referência Jatobá, linha Natural JN 6001		27% - Em Andamento
3.2 - Massa única para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência - Espessura até 30 mm inclusive andaimes e demais acessórios para a perfeita execução do serviço		30% - Em Andamento
3.3 - Pintura látex PVA, três demãos, cor branco, com massa corrida PVA, inclusive preparação de base, lixamento e limpeza, seladora, fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes.		Não Iniciada
5.1 - Fornecimento e instalação de ralo sifonado de ferro fundido Ø 100mm	3 Uni	08:00 até 11:00 (3h) 80% - Em Andamento

Ocorrências (3)
Na data de hoje foi solicitado pela Arquiteta Silvana, a troca da torneira Retrabalho Solicitação fora do escopo
Luminária com cor diferente do projeto arquitetônico e não encaixa no forro devido a diferença de altura. Solicitação fora do escopo
Visita do fiscal no canteiro de obras 13:00 até 15:00 (2h)

Materiais recebidos (2)	Materiais utilizados (2)
Massa pronta 9 sacos	Massa pronta 9 sacos
Tijolos 50 unidades	Areia 3 metros


Comentários (3)
<b>Tiago Oliveira</b> 20/07/2022 15:35 Medição das últimas janelas que estavam pendentes.
<b>Tiago Oliveira</b> 20/07/2022 15:36 As atividades de pintura não passaram pelo check list.

Débora Siqueira 10/04/2023 17:09  
 Houve a compra de materiais.

**Fotos (4)**



3.2 - Massa única para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência - Espessura até 30 mm inclusive andaimes e demais acessórios para a perfeita execução do serviço

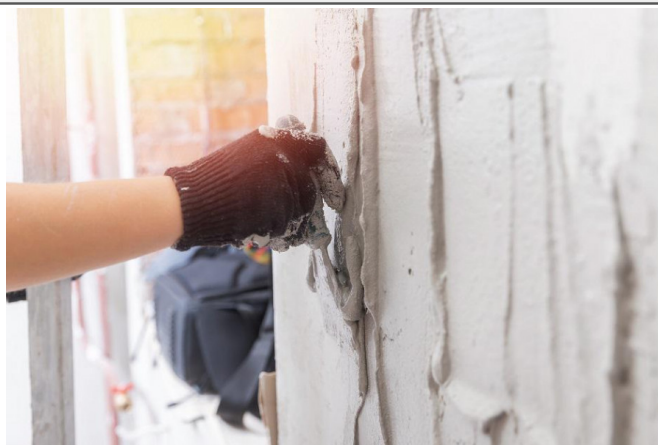

3.2 - Massa única para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência - Espessura até 30 mm inclusive andaimes e demais acessórios para a perfeita execução do serviço



3.2 - Massa única para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência - Espessura até 30 mm inclusive andaimes e demais acessórios para a perfeita execução do serviço



3.2 - Massa única para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência - Espessura até 30 mm inclusive andaimes e demais acessórios para a perfeita execução do serviço

**Vídeos (4)**

<a href="#">Vídeo 1 (visualizar).mp4</a>	00:15
<a href="#">Vídeo 2 (visualizar).mp4</a>	00:15
<a href="#">Vídeo 3 (visualizar).mp4</a>	00:06
<a href="#">Vídeo 4 (visualizar).mp4</a>	00:16

**Anexos (2)**

<a href="#">lista.xlsx</a>	4 KB
<a href="#">projeto-eletrico.pdf</a>	1 MB

José Silva  
000.000.000-00

Maria Lima  
000.000.000-00

Tiago Oliveira  
000.000.000-00
